



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806

mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 08.08, 2020r.

**Pan
Marcin Pawlicki
Radny Miasta Szczecin**

Nasz znak: WIM-I.0003.1.2020.MK

Dotyczy: **interpelacji nr 1713**, dotyczącej opóźnienia na budowie nowego węzła Podjuchy

Szanowny Panie Radjo

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizowanej inwestycji pn. „**Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową wraz z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6**” przekazuję w załączeniu harmonogram robót dla ww. zadania inwestycyjnego, który został zatwierdzony w dniu 14.08.2020r.

Zgodnie z harmonogramem do zrealizowania pozostały prace zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Ul. Floriana Krygiera

Ul. Krygiera 0+000 – 0+548

- Poz. 38 Roboty wykończeniowe

Most nad rzeką Regalica

- Poz. 45-52 Wykonanie nowego obiektu mostowego

Kładka dla pieszych

- Poz. 53-59 Wykonanie kładki dla pieszych

Ul. Krygiera 0+772 – 1+330

- Poz. 73-75 Roboty drogowe i roboty wykończeniowe

Ul. Granitowa

Odcinek 0+000 – ul. Piwna

- Poz. 96-103 Roboty drogowe w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego

Odcinek ul. Piwna – Skrzyżowanie z Krygiera

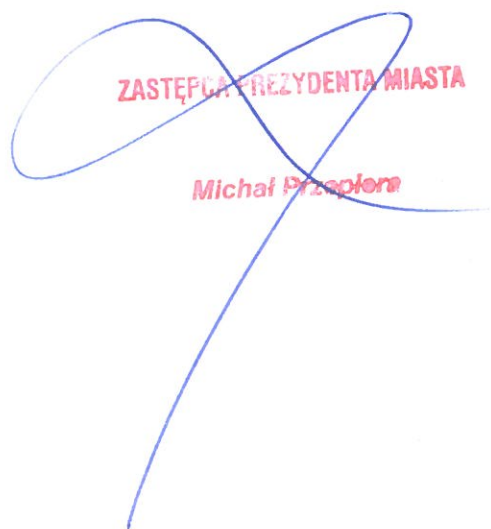
- Poz. 105-112 Roboty drogowe w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego

Odcinek Skrzyżowania z Krygiera – 0+413

- Poz. 123-130 Roboty drogowe w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego

Informuję, że w trakcie robót realizowanych w ul. Granitowej ujawniono kolizje projektowanej infrastruktury z sieciami uzbrojenia podziemnego, których położenie nie było możliwe do zlokalizowania na etapie prac projektowych. Konsekwencją ujawnionych kolizji jest konieczność wypracowania rozwiązań z gestorami sieci, co wpływa na czas realizacji robót. W związku z powyższym po ustaleniu nowych przebiegów infrastruktury podziemnej harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zaktualizowany.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przepiera
