



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 08.03.2021 r.

Pan Dariusz Matecki
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WIM-III.0003.1.2021.KM

Dotyczy: Interpelacji nr 2236.


Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Interpelację nr 2236 dotyczącą budowy Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie, informuję:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP/75/20 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie Budowy szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie ogłoszono w dniu 24 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=CF41F5091F5A4474B7F25C0B9117F1A4. W dniu 27.01.2021 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert, wpłynęły oferty 4 wykonawców. Komisja przetargowa jest w trakcie badania złożonych ofert. Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
- 2) Gmina Miasto Szczecin oświadczeniem z dnia 07.08.2021r. odstąpiła od Umowy z firmą Polaqua sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej ze względu na brak możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy, niewykonanie obowiązków umownych mimo wezwania pod rygorem odstąpienia, oświadczenia wykonawcy o niewykonaniu obowiązku umownego, rażące zaniechanie obowiązków umownych przez POLAQUA sp. z o.o. POLAQUA sp. z o.o. w wyniku odstąpienia od umowy przez Gminę Miasto Szczecin opuściła plac budowy.
- 3) Projekty wykonane dla firmy POLAQUA sp. z o.o. były wadliwe i niezgodne z programem funkcjonalno – użytkowym, co m.in. było przyczyną odstąpienia od umowy przez Gminę Miasto Szczecin.
- 4) Gmina Miasto Szczecin:
 - a) uznała Wykonawcy kwotę 24.819.778,05 zł brutto
 - b) zapłaciła Wykonawcy kwotę 23.076.824,87 zł brutto.
- 5) Gmina Miasto Szczecin naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 12.566.163,24 zł, z czego kwotę 1.359.958,43 zł potrącono na poczet kar umownych z należności wskazanych w pkt 4 lit a). Od Banku Societe Generale S.A. Gmina Miasto Szczecin otrzymała kwotę 5.946.082,30 zł tytułem realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, która została wypłacona na podstawie

żądania zapłaty Gminy Miasto Szczecin. Pozostała kwota kar umownych będzie dochodzona na drodze sądowej.

- 6) Autorem Programu funkcjonalno - użytkowego jest Pracownia Projektowa ARKADA mgr inż. arch. Anna Flicińska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 127/2.

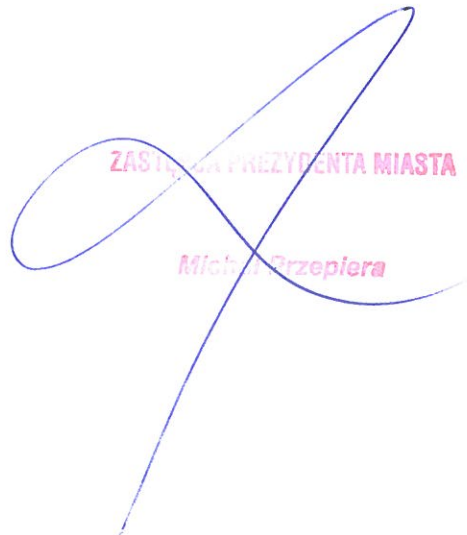

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przepiera

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIM a/a
